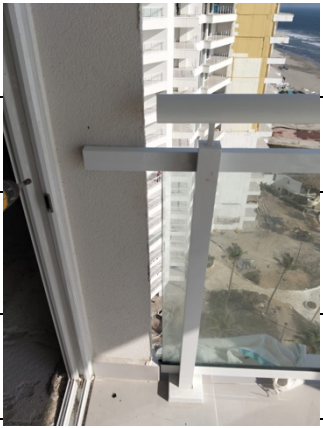


MINUTA No. 32 | Acapulco, Guerrero, a 10 de Marzo de 2026

RESIDENCIAL LAS OLAS,
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrato de **VIDRIO Y ALUMINIO**, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFIAS
Canceleria Estacionamiento	Detallado torres generales. (excepto phs)	
Cocinas, Pasillos, Colindancias	Detallado torres generales.(excepto phs)	
Fachada Mecanica	En proceso instalacion ventilas proyeccion torre F. Torre E en detallado.	
Canceles Playa	En fabricacion de cancelas PHS, tiempo estimado 1 mes y medio para iniciar a instalar. Estructura pendiente por otro proveedor para modulacion de PHA.	
Barandales	Se autoriza la modulacion de barandal en torre C. Losa pendiente por recibir en PH generales.	
Louvers	Se autoriza la modulacion de muestras actuales en torre GH.	
Puertas Pasillos	En proceso INSTALACION 85 puertas pasillo principales.	
Embellecedores Barandales	Entregados.	
Tapas Chutes Basura	Entregados. Se realiza instalacion de TORRE A Y B. (tramo pendiente demas torres)	
Portones	Entregados.	
Puertas / Ventanas Cuarto Elevadores	Sellos pendientes.	
Canceleria OFICINAS	En proceso de instalacion.	
Gimnasio, Baños Palapas	Se cancelan hasta nuevo aviso por diseño.	
Cuarto Medidores	Entregados. Puertas en proceso de instalacion.	

Comentarios: Se autoriza modular en dos secciones louvers en pasillos. Dejando 10 cm debajo para cierre de valvulas.
