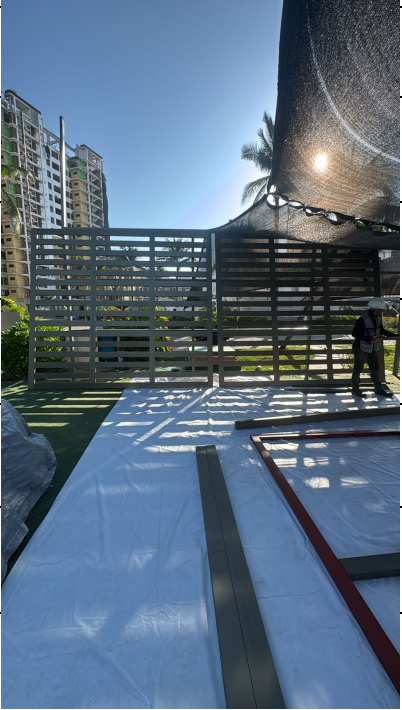


MINUTA No. 15 | Acapulco, Guerrero, a 19 de Agosto de 2025

RESIDENCIAL LAS OLAS,
A QUIEN CORRESPONDA.

De acuerdo a los conversado y relacionados al contrato de VIDRIO Y ALUMINIO, hacemos de su conocimiento la siguiente informacion:

CONCEPTO	DESCRIPCION	FOTOGRAFIAS
Ventanas Fachada Principal	En espera de tramo por otros proveedores. (Acabado MERCAN)	
Ventanas Cocinas, Pasillos, Colindancias	Colocacion al 95%. Ventana servilletero PH pendiente de fabricar.	
Fachada Mecanica	En etapa FINAL, instalacion de embellecedores torre E. En etapa de izaje bastidores torre F.	
Canceles Playa	En espera de tramo por otros proveedores. (Pintura MERCAN). Se proponen paquetes de 5 departamentos.	
Barandales	En espera de tramo por otros proveedores. (Ranuras SUREÑOS)	
Louvers	Se concluye instalacion de vertical central torre E-F.	
Puertas Pasillos	Pendiente por fabricar (según acuerdo de instalacion a finales de obra).	
Embellecedores	Fabricados en taller pendientes por entregar.	
Tapas Chutes Basura	Entregados 100 pzas.	
Portones	Fabricadas 2 hojas, 3er hoja en proceso.	
Puertas / Ventanas Cuarto Elevadores	Puertas Completadas. Ventanas colocadas. Sellos pendientes.	
Cancha Padel	Se deja pendiente para no limitar nuestro espacio de trabajo.	

Comentarios:

VITROSA
REPRESENTANTE

RESIDENCIAL LAS OLAS
REPRESENTANTE
